

質疑応答書

令和7年6月16日
社会福祉法人キューピット福祉会
理事長 堀井 桂子

入札対象工事名 「幼保連携型認定こども園ポエムキューピットこども園（仮称）新築工事」

質問番号	図面番号	質問内容	回答
1	E-001	電気設備特記仕様書では日本建築家協会仕様となっておりますが、建築特記仕様書では国交省大臣官房官庁営繕部仕様となっております。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	国交省大臣官房官庁営繕部仕様を正とします。
2	E-005	太陽光設備に関するケーブルのみエコケーブルとなっております。その他設備もすべてエコケーブルと考えてよろしいでしょうか。	エコケーブルでなくてよいです。全て一般にして下さい。
3	E-015	ガーデンライトが重耐塩仕様となっておりますが、その他屋外機器等も同様の仕様が必要でしょうか。左記対応が必要となる場合、厚鋼電線管が溶融亜鉛メッキ製、高圧気中開閉器が重耐塩仕様、テレビアンテナマストがステンレス製に変更となると思われます。	必要ないです。ガーデンライトも普通の仕様で良いです。
4	E-001 E-015	E-015にLED交換可・不可の記載があり、E-001の共通項目にも予備品の記載があります。交換可能な機器に関してはその機器の台数分(100%)計上と考えたらよろしいでしょうか？	10%計上して下さい。
5	E-024 E-025	凡例では煙感知器は埋込型ですが平面図では露出型です。どちらでみたらよろしいでしょうか？	露出でよいです。
6	A-26 A-33	1階洗濯室、2階パントリー・洗濯室に洗濯パンが点線で記載されていますが、設備工事で見えるのでしょうか。	防水パンを設備工事で入れてください。（PWP740N2W+PJ2009NW）
7	A-02 A-67 他	特記仕様書では遮音等級T-2とありますが、建具表板厚の4+A12+4及び 5+A12+5は硝子自体ではクリアしません。クリアする板厚に変更して宜しいでしょうか？	よいです。
8	A-68	AW-15 硝子品種の記載が有りません。品種をご指示ください。	A-48展開図を参照してください。寸法はAW-15とします。
9	A-04	鏡工事に 耐湿鏡5ミリとアルミミラー3ミリが有りますが、それぞれどの部分に該当するのでしょうか？	耐湿鏡5ミリ→WC1(A-56展開図を参照)/WC3(A-63展開図を参照) アルミミラー3ミリ→厨房WC
10	A-19	塗装工事について外部金属部のフッ素樹脂塗装仕上げはエスケー化研：クリーンマイルドフッソで宜しいですか。	よいです。
11	A-17	外壁：セラクリートセメントボード+フッ素樹脂塗財左官鍍仕上についてエスケー化研：ペルマートfのパターン（模様）により価格差がでますと聞きましたので パターンの決定をお願いします。	ファンシー
12	A-19	外壁：押出成形ハット板+無機複合フッ素樹脂塗料仕上は平滑仕上それとも下地パターンありでしょうか。	平滑仕上

13	A-19	外壁：デラクリートメントボード+フッ素樹脂塗料仕上は平滑仕上それとも下地パターンありでしょうか。	エスケー化研 /ベルアートf ファンシー 同等品以上
14	A-68 A-80	AW-15 建具表では、仕様の記載がありませんが、家具図では木製4枚引き戸の記載があります。どちらを正と見ればよろしいでしょうか。アルミ建具でしたら仕様をご指示ください。	A-48展開図を参照してください。寸法はAW-15とします。
15	A-37 A-64	2F WC 4の園児用トイレパーテーションのメーカー品番を教えてください。	トイレパーテーション：チャイルド本社 / ラバティコ アールタイプパーテーション
16	A-06	外部仕上表に避難ハッチの記載がありますが、取り付け場所が分かりません。ご指示ください。	避難ハッチ中止
17	E-006 E-017	電灯盤L-2の隣にある為 端子盤T-2 埋込型と考えてよろしいでしょうか。	埋め込みでお願いします。
18	E-015	電灯盤L-2（上部ダクト付）とありますが、埋込の為不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
19	E-015	照明器具：a32.0、b8.2調のコントローラ共とありますが、それぞれのコントローラの品番をご教示願います。	a32.0：odelic 0L291363BR→リモコン品番：RC911 b8.2：panasonic LGD3100LLLB1→調光品番：WTA575831WK
20		誘導灯：通Aが埋込の器具になっておりますが、A級の埋込器具がないように思われます。直付けと考えてよろしいでしょうか。	はい。お願いいたします。
21	E-001 E-002	E-001ではキュービクルが屋外型となっておりますが、E-002ではキュービクルが屋内型となっております。屋内型と考えてよろしいでしょうか。	屋内型で結構です。
22		キュービクルの搬入経路をご教示願います。	SD-05を両開き扉 W=2000 H=2200に変更、取付位置をX5通り側にし道路側より搬入/メンテナンスとします。
23	E-006 E-024	E-006の緊急通報装置（消防用）とE-024自動通報装置は同じ物と考えてよろしいでしょうか。同じの場合は、自火報図面を正としてよろしいでしょうか。	はい。結構です。
24		下水引込の負担区分(施主か町の負担確認)より開発工事に該当しないでよろしいでしょうか。	開発には該当しません。
25	M-003 M-004	公共桧が新設となっておりますが、既設は無いと考えてよいでしょうか。撤去は見込まなくてよいでしょうか。	あるのですが、位置が違います。
26	M-002 M-008	4D 子供用マルチシンクですが、水栓数が機器表では3 個となっておりますが平面図では2 個です。どちらを正とすればよいでしょうか。	平面図を正として下さい。
27	M-007	洗濯室の排水仕様について表記が無いですが防水パンもしくは洗濯用排水金具は必要ではないでしょうか。	防水パンを設備工事で入れてください。（PWP740N2W+PJ2009NW）
28	M-009	450 角会所の化粧蓋の詳細をご教授ください。	建築の床と同じ仕様でお願いします。
29	M-003	小口径桧D〜J, O, P の化粧蓋の詳細をご教授ください。	建築の床と同じ仕様でお願いします。
30	S-08 A-38 A-41	意匠図では1階園庭デッキ下にRCスラブが見受けられますが、構造図ではありません。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	意匠図を正としてください。S-08に建物外土間コンクリートを追記します。断面はS-15参照してください。

31	S-08 S-11	Y1通り軸組図ではX1端にW18がありますが、伏図ではありません。軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	伏図が正です。軸組図修正します。
32	S-08 S-12	X1通り軸組図ではY1端にW18がありますが、伏図ではありません。伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	伏図が正です。軸組図修正します。
33		根切開始バルは設計GLからと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	現状地盤面は、GL±0で考えてください。
34	S-14 A-38～42	土間コンクリート下地業が意匠図と構造図とで相違しています。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	コンクリート厚さ、配筋は構造図を正としてください。 スタイロ、フィルムシートの種類は意匠図を正としてください。 捨てコンは不要です。
35		埋戻土は購入土と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	根切り土の中の良土としてください。 (S-01特記仕様書「§3仮設工事,土工事」参照。)
36	S-16	丸柱C13,C14について、鋼材種がSTKN400Bとなっておりますが、現状、当鋼材納期が6ヶ月程度となっております。工期を考慮し、STKN490Bに変更しても宜しいでしょうか。	よろしいです。
37	E-008	外壁に取付く高圧引込架台はどのようにお考えでしょうか。引っ張り等の強度の検討も必要かと思われますので、詳細について図面・資料等にてご教示願います。	SUS製のPAS外壁支持金物（電設資材・金物.COMの写真参照）相当をみています。
38	A-83	X1通り アルミ製樋の仕様・取付材を御指示下さい。	タニタ：ビルアルミ デカノキ H12号 吊金具取付
39	A-06 A-16	ソーラーパネル用置き型架台 溶融亜鉛メッキ鋼板+コンクリートブロックの形状及び範囲を御指示下さい。	溶融亜鉛メッキ鋼板+コンクリートブロック中止→立平葺き用ソーラーパネル取付金物に変更
40	A-06	屋上点検ハッチ SUS製において、バルコニー上部とありますが平面図等にありません。設置位置及び仕様を御指示下さい。	屋上点検ハッチ SUS製中止
41	A-06	避難ハッチ SUS製において、バルコニーとありますが平面図等にありません。設置位置及び仕様を御指示下さい。	避難ハッチ SUS製中止
42	A-44	屋根 トップライトにおいて、トップライト廻りの納まりを御指示下さい。	三和式ベンチレータ （HBQ-1300GDB/HBQ-900GDB）納まり参考図参照 (https://www.sanwaventi.co.jp/Prodcut27.html)
43	A-06 A-38	バルコニー 床防水において、仕上表ではウレタン塗膜防水ですが断面詳細図ではアスファルト系露出防水層(JSX-925GF同等品)と相違します。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
44	A-06 A-38	仕上表 庇において、断面詳細図等にある屋根端部の事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
45	A-17	北立面図 スロープ手摺において、仕様を御指示下さい。	ビニル手摺：ナカ工業/高耐候ガラス (0-34)+UN-55
46	A-25	エントランス ポーチ 点字鋲 SUSにおいて、メーカー・品番を御指示下さい。	ナカ工業：ガイドステップSCS14同等品
47	A-40	床 磁器質タイル t=9 踏面蹴込において、段鼻部分の仕上を御指示下さい。	LIXIL /アレス 300×100mm角垂れ付き段鼻
48	A-43	踏面 モルタル金鰻押え内の溶接金網はφ3.2-50*50程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。

49	A-43	階段 中壁側の手摺において、左側の平面図では手摺が有るように見えますが右側の平面図では手摺が無いように見えます。中壁側の手摺は不要と考えて宜しいでしょうか。又、必要な場合は仕様を御指示下さい。	屋外階段の中壁側に手摺が抜けていましたので追加します。ビニル手摺：ナカ工業/高耐候グラン (0-34)+UN-55 →追加資料01参照
50	A-27	雨水会所300角 コンクリート蓋(建築工事)において、断面詳細を御指示下さい。	雨水会所 会所桝300 H=900
51	A-3 A-6	コンポジションビニル床タイルの厚さが、特記仕様書はt2.0、仕上表はt=3.0と異なります。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を正とします。
52	A-3 A-6	壁下地の耐水石膏ボードが、特記仕様書はt12.5、仕上表はt12と異なります。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
53	A-6 A-38～42	1. 2F外壁廻り(外壁:アスロック)の壁が、仕上表、断面詳細図にGL工法と記載が御座いますが、LGS65型のフカ壁と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	1. 2F外壁廻り(外壁:アスロック)の壁はGL工法、柱型等LGS65型のフカ壁です。
54	A-26	廊下に面する壁は耐火間仕切とする。と仕上表に記載が御座いますが、Rの壁の仕様は直線が耐火間仕切、Rの壁は間仕切と同じと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
55	A-6 A-54	厨房巾木仕上が、仕上表はSUS巾木、展開図はツグ巾木と異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
56	A-6 A-26 A-29 A-56 A-57	WC1・2の床下地が、仕上表・展開図はセルフベリング、平面詳細図はSL+100=FL(乾式二重床)と異なります。仕上表・展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表・展開図は誤りです。平面詳細を正とします。(WC3,4と同仕様)
57	A-6 A-56 A-57 A-63 A-64	WC1～4の壁下地が、仕上表はPB12.5、展開図は耐水ボードt=12と異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
58	A-6 M-11	2F保育室3～5床仕上げに、床暖用タイルt11の記載が御座いますが、設備図は2Fに床暖の記載が御座いません。床暖は無、床暖用ではないタイルt11を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
59		上記質疑にて、タイルを見込む場合、メーカー品番御座いましたら御指示下さい。	セキスイ：MESEKI(目積)
60	A-6	確認ですが、仕上表備考欄に壁内にない柱、及び間柱は全て耐火シートとすると御座いますが、内部の柱は全て耐火シートと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	屋内は円柱のみ耐火シートです。(外部露出柱は耐火塗料)
61	A-32	2F保育室3・4・5・遊戯室に床下開口ハッチの記載が御座いますが、詳細不明です。詳細御指示下さい。	床下開口ハッチ：株)S・DC / NFH-180GA
62	A-6 A-23～24 A-38～42	仕上表備考欄にロールブラインド(全室共通)と記載が御座いますが、天井伏図・断面詳細図はカーテンボックスと異なります。天井伏図・断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。(ロールブラインドは建具表に記載部分に設置)
63		保育室4のA面にRの壁が御座いますが、下地はFGボードt6.0を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。(R壁部分は全てFGボードT=6.0)
64		上記質疑にて見込む場合、メーカー品番御座いましたら御指示下さい。	FGボード / 株式会社エーアンドアーマテリアル

65	A-6. 39	耐火壁の仕様が、仕上表は強化PB25×2(LGS75)、断面詳細図はPB15と異なります。耐火認定番号:QF060BP-9072より強化PB15を両面貼と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表が正です。断面詳細図の耐火認定番号:QF060BP-9072→間仕切壁（共通）/60分耐火認定番号：FP060NP-0415(2)に変更 →追加資料02//03参照												
66		前室上框内(GL+20の範囲)床仕上げは、部屋全体同様のセルフレベルリング+NSシート800と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。												
67	A-6 A-64	WC4の巾木仕上が、仕上表は樹脂巾木、展開図はソフト巾木と異なります。仕上表を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。												
68	A-6 A-24 A-64	パントリー・洗濯室仕上表が仕上表・天井伏図・展開図にて下記のように異なります。仕上表を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 <table><tr><td>仕上表</td><td>天井伏図</td><td>展開図</td></tr><tr><td>・壁 石膏ボード t12.5</td><td></td><td>耐水ボード t12</td></tr><tr><td>・天井 化粧ケイカル板</td><td>左記に同じ</td><td>化粧ケイカル板+VP</td></tr></table>	仕上表	天井伏図	展開図	・壁 石膏ボード t12.5		耐水ボード t12	・天井 化粧ケイカル板	左記に同じ	化粧ケイカル板+VP	よいです。			
仕上表	天井伏図	展開図													
・壁 石膏ボード t12.5		耐水ボード t12													
・天井 化粧ケイカル板	左記に同じ	化粧ケイカル板+VP													
70	A-44	Stパイプ 34φ加工SOP塗装仕上の手摺が必要な場合、施工範囲御指示下さい。	手摺はビニル手摺：ナカ工業/高耐候グーラン（0-34）+UN-55となります。												
71	A-6 A-38～42	仕上表と断面詳細図で下記の通り相違が御座います。仕上表を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 <table><tr><td>仕上表</td><td>断面詳細図</td></tr><tr><td>・遊戯室-床 パーティクルボード t20</td><td>パーティクルボード t20+合板 t12</td></tr><tr><td>・エントランス-床 上に同じ</td><td></td></tr><tr><td>・医務・休憩室-床 上に同じ</td><td></td></tr><tr><td>・職員室-床 上に同じ</td><td></td></tr><tr><td>・厨房-天井 ケイカル板+VP塗装</td><td>ケイカル板</td></tr></table>	仕上表	断面詳細図	・遊戯室-床 パーティクルボード t20	パーティクルボード t20+合板 t12	・エントランス-床 上に同じ		・医務・休憩室-床 上に同じ		・職員室-床 上に同じ		・厨房-天井 ケイカル板+VP塗装	ケイカル板	パーティクルボード t20+合板 t12としてください。厨房天井は仕上表を正とします。
仕上表	断面詳細図														
・遊戯室-床 パーティクルボード t20	パーティクルボード t20+合板 t12														
・エントランス-床 上に同じ															
・医務・休憩室-床 上に同じ															
・職員室-床 上に同じ															
・厨房-天井 ケイカル板+VP塗装	ケイカル板														
72	A-4 A-21 A-22 A-38～42 A-83～86	断熱の仕様・範囲が特記仕様書・断面図・断面詳細図・詳細図で異なります。下記の通りと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・床-仕上 フェノールフォーム断熱材 t20(特記仕様書を正) ・床-範囲 1F 厨房・前室・玄関以外(断面詳細図を正) 2F 外壁廻り全て(断面詳細図を正)	よいです。												
73		上記質疑にて、断熱範囲が異なる場合、施工範囲図示にて御指示下さい。													
74		層間塞ぎの記載が御座いませんが、ロックール充填を見込むと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。												
75	A-6	消火器ボックスの個数が、仕上表備考欄は1階に4か所・2階に1個所、メーカーリストは1、2階計2か所と異なります。仕上表備考欄を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。												
76	A-4	黒板及びホワイトボードに○印が御座いますが、設置個所不明です。必要でしたら設置個所御指示下さい。	黒板及びホワイトボード中止 ホワイトボードシート t=0.8 端部R加工は保育室各室に設置（展開図参照）												
77	A-75 A-81	家具図に各家具の数量の記載がありません。平面詳細図のキャプションの数量を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。												

78	A-75	下記家具の吊収納の下地補強の仕様は、ベンチt=9を2段程度見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・家具1 ・家具2 ・家具15 ・家具17	よいです。
79	A-26 A-76	下記家具寸法が、家具図と家具図(姿図), 平面詳細図で相違が御座います。家具図(姿図)と平面詳細図が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 家具図 家具図(姿図) 平面詳細図 (正) 家具6(下足収納) W2900*D360*H920 W2240*D360*H920 家具7(ベンチ) W1700*D360*H920 W702. 5*D360*H896 家具8a(ベンチ) W1700*D360*H920 W1200*D1200*H350 家具8b(ベンチ) W1700*D360*H920 W1200*D700*H350 家具18(収納棚) W450*D350*H1230 W2350*D240*H310	よいです。
80	A-80	家具番号10、17が重複しております。下記のとおり読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 現 読み替え番号 ・ A-80図 手洗いカウンター+収納棚 10 18 ・ A-80図 カウンター+収納棚 17 19	よいです。
81	A-81	家具番号20の名称、寸法、仕様が記述と姿図で相違が御座います。下記のとおり姿図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 記述 姿図 名称: 手洗いカウンター+収納棚 引出収納 寸法: W2350*D430*H590 W1800*D1320*H500 仕様: 天板有り 天板無し	よいです。
82	A-04	ユニット及びその他の工事の「8. 鏡」について、耐湿鏡t=5とアルミラー t=3がありますが、それぞれの部分に該当しますでしょうか。ご教示願います。	耐湿鏡 5 ミリ→WC1(A-56展開図を参照)/WC3(A-63展開図を参照) アルミミラー3ミリ→厨房WC
83	A-67	AW2(総数3か所)で2か所が非防火設備、1か所が防火設備の指示が御座います。防火設備の1か所は2階 保育室3と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	AW-02防火設備は乳児室となります。
84	A-67	AW6(総数4か所)で1か所が非防火設備、3か所が防火設備の指示が御座います。防火設備の3か所は1階 保育室1, 保育室2、2階 保育室4と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	建具表は誤りでAW-06は全て防火設備となります。
85	A-71 A-74	下記建具数量が建具表に記載がありません。キープランを正として各1か所ずつを見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・ SSD3(2階園庭-デッキ) ・ WD18(1階WC2)	よいです。
86	A-74	上記質疑に関連して、WD18の使用箇所が2階WC4と記載がありますが、キープランを正として1階WC2に1か所見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
87	A-66 A-70	SD6の数量がキープランは1か所、建具表は2か所と相違が御座います。キープランを正として1か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。






88	A-71	SSD2(1階屋外通路)の名称が両袖付き片開き門扉と記載がありますが、建具表の姿図より両袖付き親子開き門扉と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
89	A-68	AW15(1階パントリー)の詳細仕様が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・仕上:電着塗膜/テクスガード®(ホワイト) ・ガラス:FL3+A12+FL3 ・網戸無し ・LIXIL:PRO-SE同等品	A-48展開図を参照してください。寸法はAW-15とします。
90	A-72 A-73	下記FIX窓に網戸の指示が御座いますが、適用無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・AW5(1階 医務室) ・AW9(1階 職員室)	よいです。
91	A-71	SSW10, SSW11のガラス押え(ポリカーボネート)の寸法は5×5を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
92	A-83	詳細図の無いWD5, 6, 8, 9, 12の額縁枠と床見切の仕様は、下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・額縁枠 WD5, 6/片引き:50*25 堅木 木材保護塗装 WD8, 9, 12/片開き:150*25 堅木 木材保護塗装 ・床見切 AL FB t=5	よいです。
93	A-83	AW5～7の詳細図がFIX窓の図示ですが、AW6, 7は外倒しやたてすべり出し窓があります。AW5～7の詳細図はFIX窓であるAW5の詳細図と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
94	A-65 A-66	人の出入りがある、または保育室に設置される建具のガラス部に、下記仕様の衝突防止マークを見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 【仕様】 SUS製 φ30 @300 【適用建具】 ・AD1a(1F医務室/休憩室) ・AD1b(2F遊戯室) ・AD2(1Fエントランス) ・AW1(1Fエントランスホール、2F保育室3) ・AW2(1F園長室、乳児室、2F保育室3) ・AW10(2F遊戯室) ・AW11(2F廊下) ・AW12(2F廊下) ・AW13(2F保育室3, 5)	よいです。

95	A-67	AW6の各ガラス仕様の内訳は下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 【非防火設備】 ・外倒し排煙窓：FL3+A12+FL3 ・FIX窓：FL4+A12+FL4 【防火設備】 ・外倒し排煙窓：ST5+A12+Low-E4 ・FIX窓：ST5+A12+Low-E5	質問番号7を参照してください。ただし遮音等級T-2が不可の場合は表記通りで良いです。
96	A-67	AW7の各ガラス仕様の内訳は下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・たてすべり出し窓：FL3+A12+FL3 ・FIX窓：FL4+A12+FL4	質問番号7を参照してください。ただし遮音等級T-2が不可の場合は表記通りで良いです。
97	A-72 A-73	木製建具について、WD-08, 09, 12, 13に「MDF+HPJシート」と記載がありますが、「HPJシート」について、通常のHPJシートと読み替えても宜しいでしょうか。ご教示願います。	よいです。
98	A-02 A-67他	特記仕様書では、遮音等級T-2とありますが、(建具表)板厚の「4+A12+4」及び「5+A12+5」他板厚は硝子自体では、等級を満たせません。遮音等級を満たすことができる板厚に変更する必要はありますでしょうか。ご指示願います。	質問番号7を参照してください。ただし遮音等級T-2が不可の場合は表記通りで良いです。
99	A-68	AW-15について、建具の仕様等が記載されておられません。ご教示願います。	A-48展開図を参照してください。寸法はAW-15とします。
100	A-82	外構凡例において、コンクリート製U字溝W=300の記載が御座いますが外構図に図示が無く設置範囲が不明です。 本工事では適用無しと考えましたが宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
101	S-41	型枠CBの参考メーカー品番等御座いましたら詳細を御指示下さい。	株式会社トーホー：CP型枠400
102	A-82	雨水排水管について、規格が不明です。全てVPφ100程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。ただし敷地西側のみVPφ150としてください。
103	A-82	雨水会所柵・雨水排水管について、建物下範囲も外構工事に含めると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よいです。
104	A-82	敷地西 境界フェンスH=1500とH=1200について基礎部が不明です。各寸法、根入れ、仕上、配筋、捨てコン砕石等の詳細をそれぞれ御指示下さい。	フェンス基礎ブロック250角 H=800 @2000 捨てコン t=30 砕石 t=100
105	A-82	砂場について、断面が不明です。底盤や立上り等が必要でしたら配筋含め詳細を御指示下さい。	底盤：砕石 t=100 立上り：コンクリートブロック 100×1902段+JSガードクッション（安全器材株式会社）
106	A-82	外構床仕上の断面が不明です。下記の様に考えましたが宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・ウッドデッキ下地コンクリート T150 土間コン(D10@200S)+t100 砕石 ・インターロッキング舗装 T80 ILブロック+t20 敷砂+t100 砕石 ・コンクリート舗装 T150 土間コン(D10@200S)+t100 砕石 ・タイル舗装下地コンクリート 同上	よいです。

107	A-82	樹種リストにおいて、ヤマシジ・ハミズキ・シマトリコ(株立)に支柱を見込むと考えて宜しいでしょうか。正の場合、支柱の仕様を御指示下さい。	ハツ掛支柱（丸太）
108	M-002	ヒートポンプ 給湯器について、コンクリート基礎H=200との記載ですが詳細が不明です。各寸法、根入れ、配筋、捨てコン砕石等の詳細を御指示下さい。	架台と言うよりは、他と区別する程度と考えて下さい。
109	A-82	外構工作物において、下記の様に考えましたが宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・埋戻し土→B種 ・残土処分→構外搬出 ・捨てコン→Fc-18 S-15 ・その他工作物→Fc-21 S-18	・埋戻し土→質問番号35：根切り土の中の良土としてください。（S-01特記仕様書「§3仮設工事,土工事」参照。） その他は表記通りで良いです。
110	A-82	北側隣地境界線から目隠し塀間において、白抜き範囲が御座いますが詳細が不明な為詳細を御指示下さい。	白抜き範囲がわかりません。
111	A-82	西側隣地境界ラインに既存擁壁撤去と記載がありますが、点線で囲われた部分の北端部から道路境界に向って、擁壁の天端が見えていたのですが、この擁壁についても解体するとの認識で宜しいでしょうか。	よいです。
112	A-01	「9. 室内の空気中の化学物質濃度の測定」にチェックが入っておりませんが、シックハウス測定は不要との認識で宜しいでしょうか。	よいです。
113	A-06 A-67他	メーカーリストや建具表、他図面に記載されているメーカー・材料・品番等については指定でしょうか。同等品がある場合は、選定可能と考えても宜しいでしょうか。	同等品で選定可能ですが、デザイン、寸法、仕様、性能、色等考慮に入れてください。同等品で選定しても条件が合わない場合メーカーリスト製品になる可能性はあります。
114	—	履行保証金は、契約金額の10%との認識で宜しいでしょうか。	よいです。
115	—	当工事は、「建設業退職金共済制度(建退共)」に該当しますでしょうか。ご教示願います。	該当します。
116	—	建設地の上空に高压線がありますが、事前協議は実施済みでしょうか。施工するにあたり、見込んでおく費用等ございましたら、内容及び金額についてご教示願います。また、当件について、別途であれば、その旨ご教示願います。	関電には電話にて当該送電線について法令で定められた離隔距離等確認していますが、施工上の問題については確認してください。
117	—	現在、御見積で使用しております図面は、実施設計の最終図との認識で宜しいでしょうか。（受注した際に鋼材等の手配を急ぐ必要がある為）	よいです。
118	—	「構造適判」及び「確認降下日」の日付は、いつになりますでしょうか。ご教示願います。	7月末予定です。
119	—	工程を検証するにあたり、工事着手日は、いつと考えれば宜しいでしょうか。ご教示願います。	8月4日頃としてください。
120	A-28	キュービクル室のサッシ開口はSD-05、W=750の1ヶ所のみとなっておりますが、キュービクルの出入りが困難かと思われます。どのようにお考えかご教示願います。また、後のメンテナンスの方法についても同様にご教示願います。	質問番号22参照
121	—	南側の水路の管理をされている管理者様の連絡先をご教示願います。	確認していません。

122	M-001	工事種目別仕様「○厨房設備 ○全て本工事に含む」とありますが、機械設備に含むと考えるのでしょうか。もしくは建築工事でしょうか。ご教示下さい。	機器は全て建築です。水栓・排水などが設備です。
123	M-001	工事区分「給湯器の2次側(リモコン～本体含む)配線」について、EB-1 ヒートポンプ 給湯器にリモコンがありますが、機械設備、電気設備どちらの工事範囲と考えれば宜しいでしょうか。また、リモコン位置が不明なため 合わせてご指示下さい。	前室入り口付近に機械工事をつけて下さい。
124	M-001	工事区分 雨水排水設備について、●設備、●建築となっておりますが、機械設備図M-005では不明です。建築工事と考えて宜しいでしょうか。	建築ですよいです。
125	M-001	メーカーリスト ●床暖房 パナソニック電工となっております。指定と考えて宜しいでしょうか。	いいえ。同仕様なら別でも良いです。
126	M-002	衛生機器表 EB-1、EB-2の電気温水器 備考にコンクリート基礎 H=200と記載があります。機械設備で見込むのでしょうか。	架台と言うよりは、他と区別する程度なので、機械設備にいれました。
127	M-004	下水引込みについて、点線で書かれております。引込み管については既設再使用、X接続(公共)桝については新設と考えれば宜しいでしょうか。	そうです。
128	M-009	注)2、「給水・給湯は原則天井配管とする」とありますが、図面では埋設配管に読み取れます。給湯管のみ天井配管で考えて宜しいでしょうか。	厨房だけ給水・給湯とも天井配管として下さい。
129	M-009	厨房内に桝450×450(内部グレーチング)化粧蓋とあります。桝については、コンクリート製既成品と考えて宜しいでしょうか。また、グレーチング・化粧蓋の仕様についてご教示下さい。	基本は枡として使用しないので、外見は点検口、内部が会所です。既製品があれば既製品でもよいですが、ないのでは。
130	M-010	機器表(1)で空調集中リモコンの記載がありません。集中リモコンの品番又は仕様についてご教示下さい。また、RAC1-1 ルームエアコンも集中リモコンに取込むと考えますが宜しいでしょうか。	D C S 3 0 2 C 1 です。ルームエアコンも取り込んで下さい。
131	M-015	換気用コントローラースイッチ 24時間SW及び全熱交換機のSWは、電気設備へ支給すると考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
132	M-015	換気ダクト外の保温について、M-001 特記事項 7、「給気ダクト外は全て保温施工のこと」とあります。排気ダクト外については、どう考えれば宜しいでしょうか。ご教示下さい。	外部から1 mまで保温して下さい。
133	M-009	厨房用排水管は全てVPと考えて宜しいでしょうか。耐熱仕様がありましたら、管材及び範囲についてご教示下さい。	1 7 は直接会所に持って行き、4 0 はHTとし機器回りとします。
134	M-015	壁付給気口の記号で「C α」、「B α」とありますが、ベントキャップにFDを付けるかどうかの記号と考えて宜しいでしょうか。	αはないです。Aの間違いでは？
135	M-001	特記事項10：給水管の保温は防凍措置を講じるとありますが、保温厚をご指示下さい。	特に外部にもっていく給水管は、国交省大臣官房官庁営繕部仕様に＋1 0 mm厚みましとして下さい。
136	M-007	1階の配管は埋設配管でしょうか。ご教示下さい。	厨房以外は埋設です。
137	M-007 M-008	1階、2階屋外水廻り…隠ぺい仕様で宜しいでしょうか。また、屋外露出配管はありますでしょうか。	排水が少しある位です。
138	M-009	厨房内露出の給水・給湯の保温の仕様をご指示下さい。	国交省大臣官房官庁営繕部仕様通りとします。
139	M-017	厨房用排気ダクト外は保温要でしょうか。要の場合の仕様をご指示下さい。	国交省大臣官房官庁営繕部仕様通りとします。

140	E-001	電気設備特記仕様書では日本建築家協会仕様となっておりますが、建築特記仕様書では国交省大臣官房官庁営繕部仕様となっております。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	国交省大臣官房官庁営繕部仕様を正とします。
142	E-005	太陽光設備に関するケーブルのみエコケーブルとなっております。その他設備もすべてエコケーブルと考えてよろしいでしょうか。	質問番号2を参照
143	E-015	ガーデンライトが重耐塩仕様となっておりますが、その他屋外機器等も同様の仕様が必要でしょうか。左記対応が必要となる場合、厚鋼電線管が溶融亜鉛メッキ製、高圧気中開閉器が重耐塩仕様、テレビアンテナマストがステンレス製に変更となると思われます。	質問番号3を参照
144	E-001 E-015	LED交換可・不可の記載があり、E-001の共通項目にも記載があります。交換可能な機器に関してはその機器の台数分（100%）計上と考えたらよろしいでしょうか。	質問番号4を参照
145	E-024 E-025	凡例では煙感知器は埋込型ですが平面図では露出型です。どちらでみたらよろしいでしょうか。	質問番号4を参照
146	A-06	表札、室名札、掲示板の詳細が不明です。文字数など仕様を教えてください。	表札(2箇所):SUS 300□ t=2.0 パイフレーション仕上 背面ボルト浮かし止め(文字別途) 室名札→別途 掲示板(2箇所):アルモード/ピンナップボード 6618S
147	A-06	避難ハッチ、屋上点検ハッチの詳細が不明です。サイズなど仕様を教えてください。	避難ハッチ、屋上点検ハッチ→中止
148	A-06	オーニングの詳細が不明です。設置場所、サイズなど仕様を教えてください。	マルキルックス/3300 W=3800 d=2500 取付場所:砂場上部2階手摺下部壁面
149	A-17	外壁サインの詳細が不明です。サイズなど仕様を教えてください。	A-17北立面図でサイン部分が外壁同仕上になっていますが誤りで、正しくはサイン部分を アルポリックfr t=3.0mm+文字デザイン部分を3M スコッチカルフィルム貼りとしてください。
150	A-06 A-38	エントランス、廊下に面する間仕切り壁について 仕上げ表ではPB t=25×2(LGS75)とありますが断面詳細図01ではPBt=15 60分準耐火(共通)となっています。1時間耐火間仕切壁で考えると強化PB12.5+12.5の両面貼りとなりますが、エントランス、廊下に面する耐火間仕切りの仕様を教えてください。	質問番号65参照
151	A-02	木工事 造作用集成材(サッシ額縁、3方枠等)の樹種が不明です。ゴム集成材で考えてよろしいでしょうか。	良いです。ゴム集成材+塗装:日本ペイント/オーデノータック同等品としてくだい。

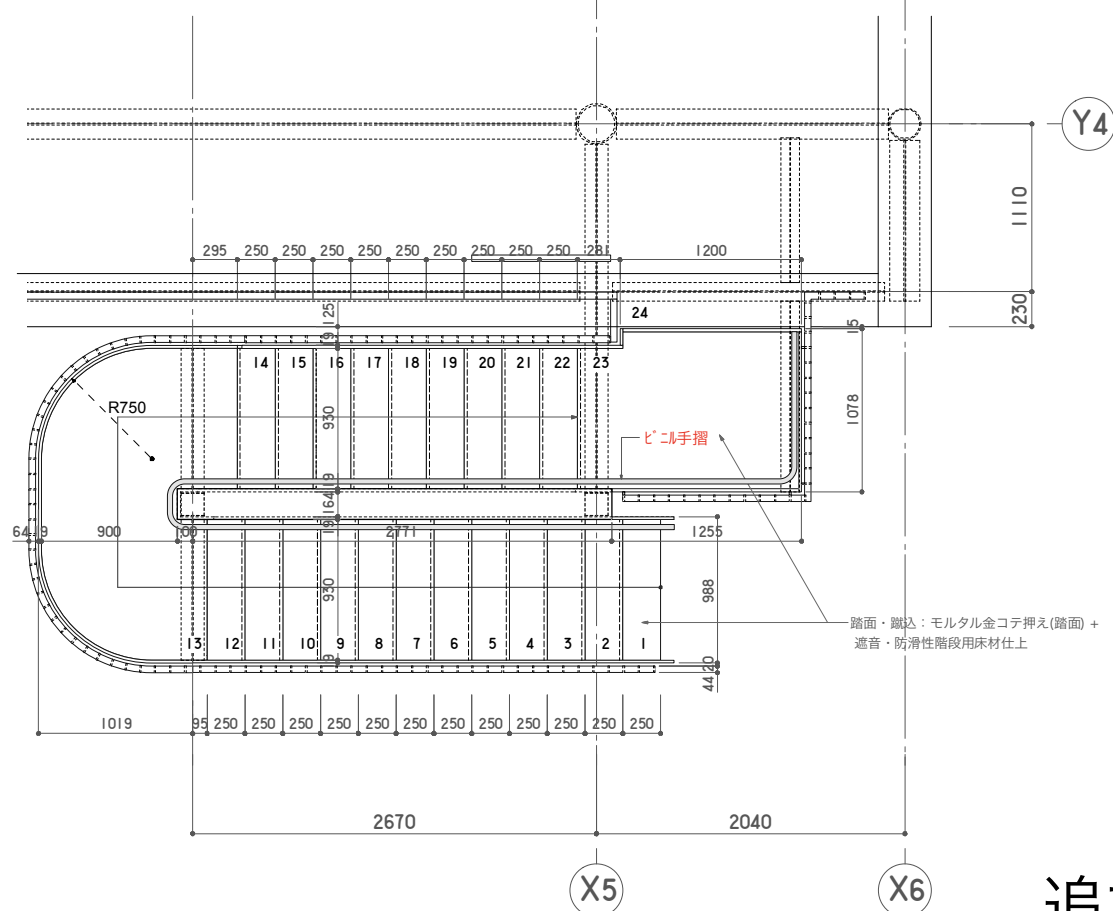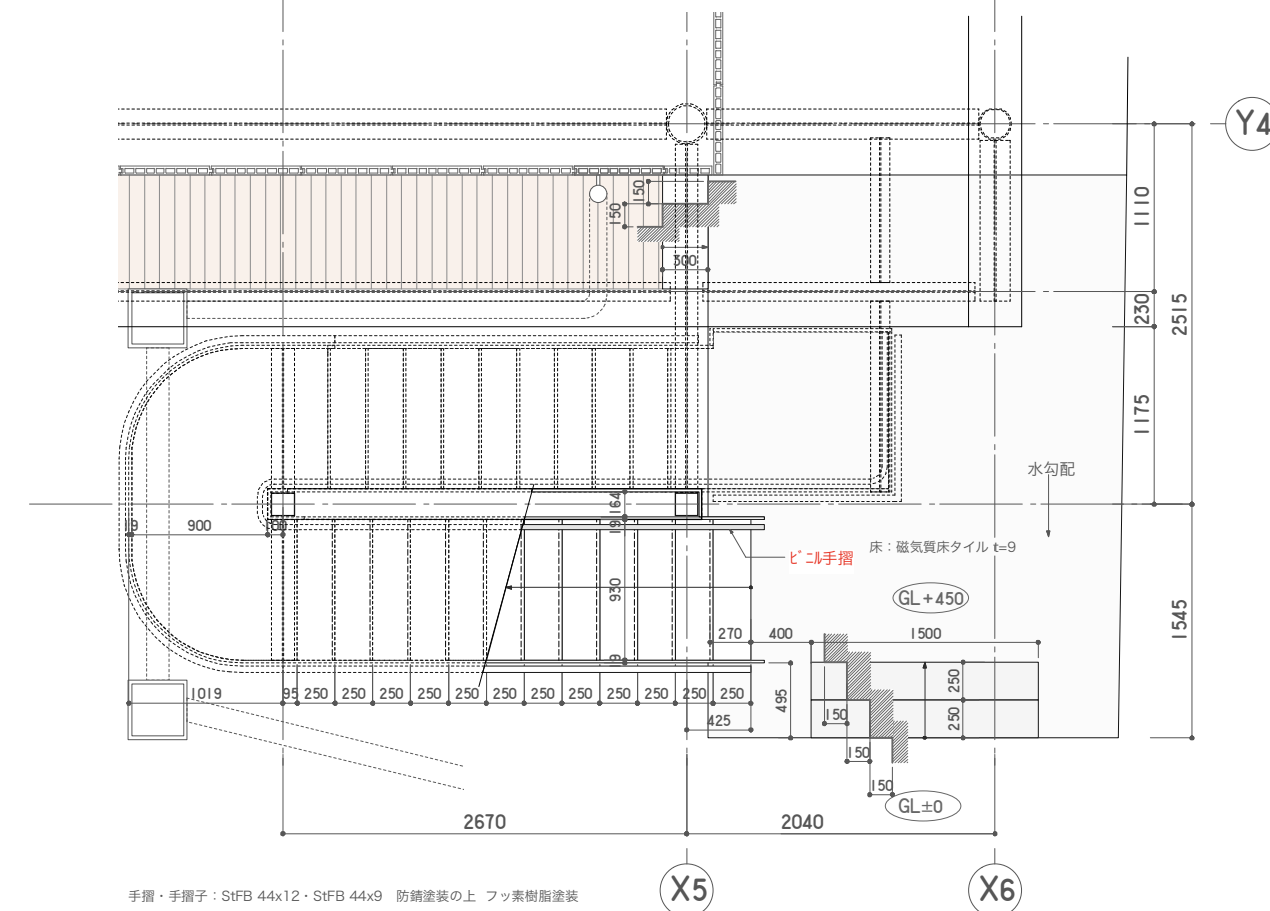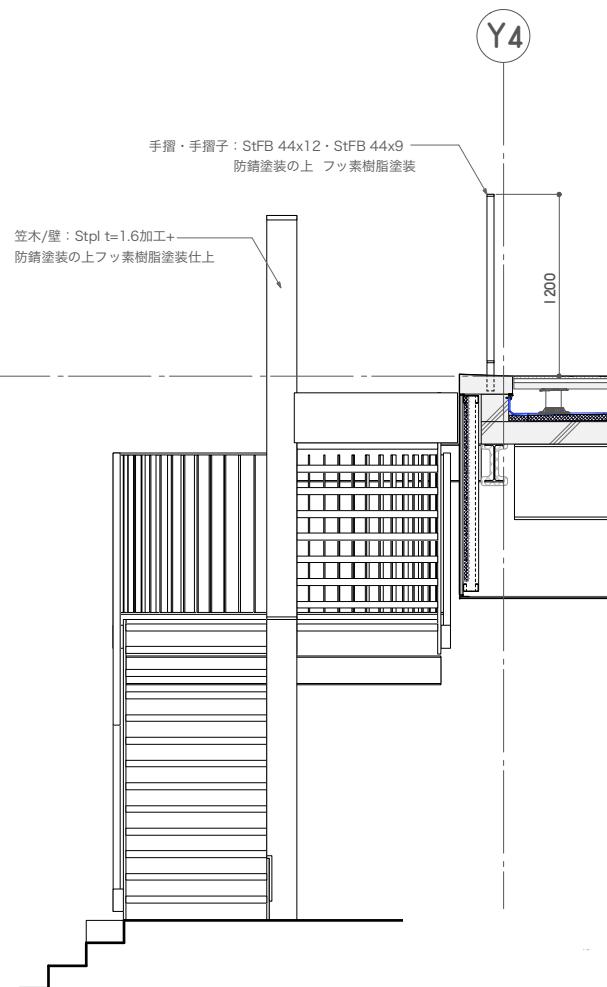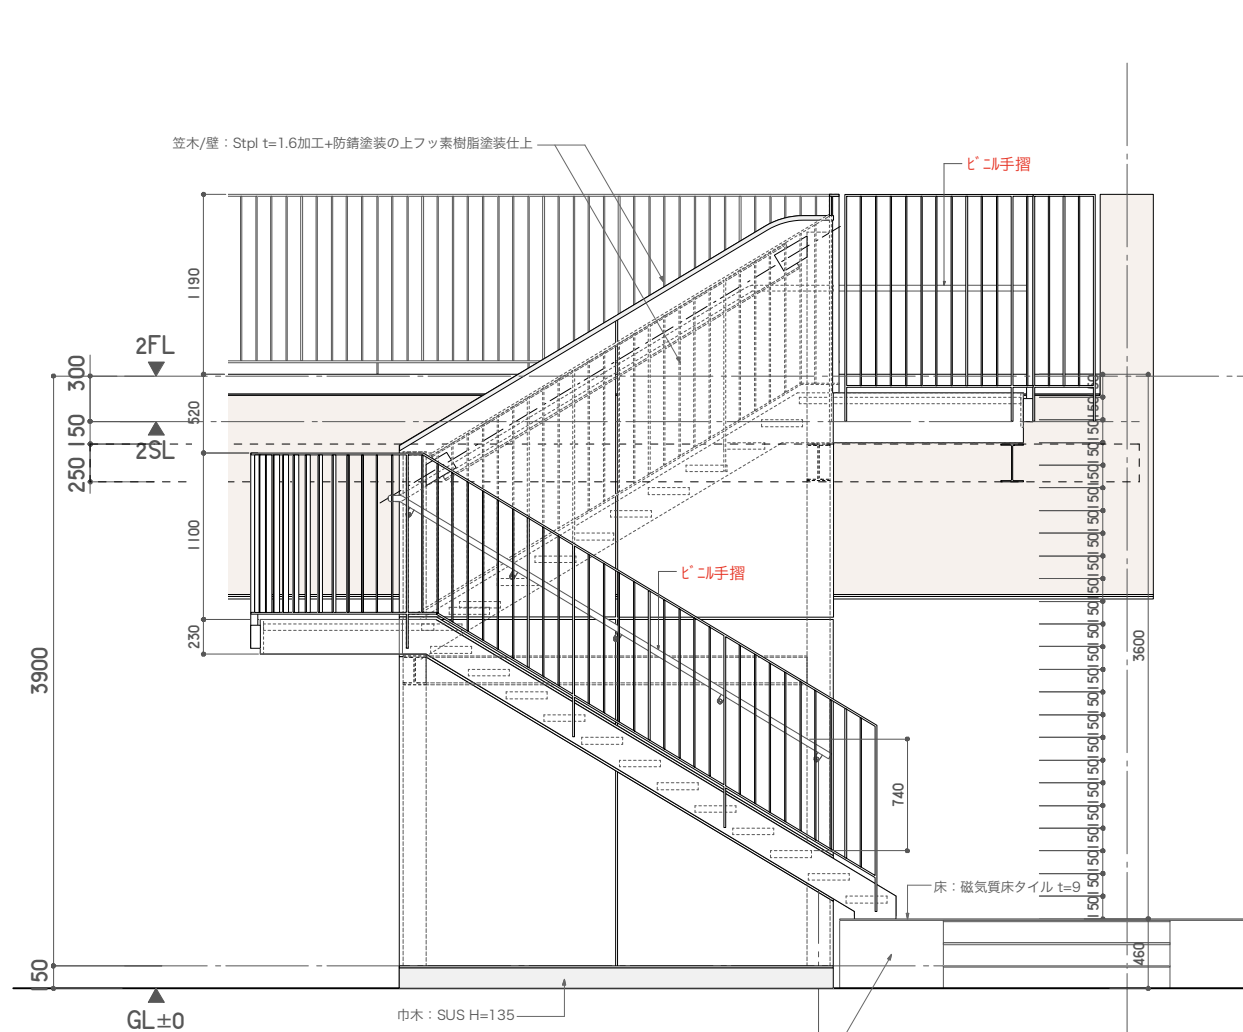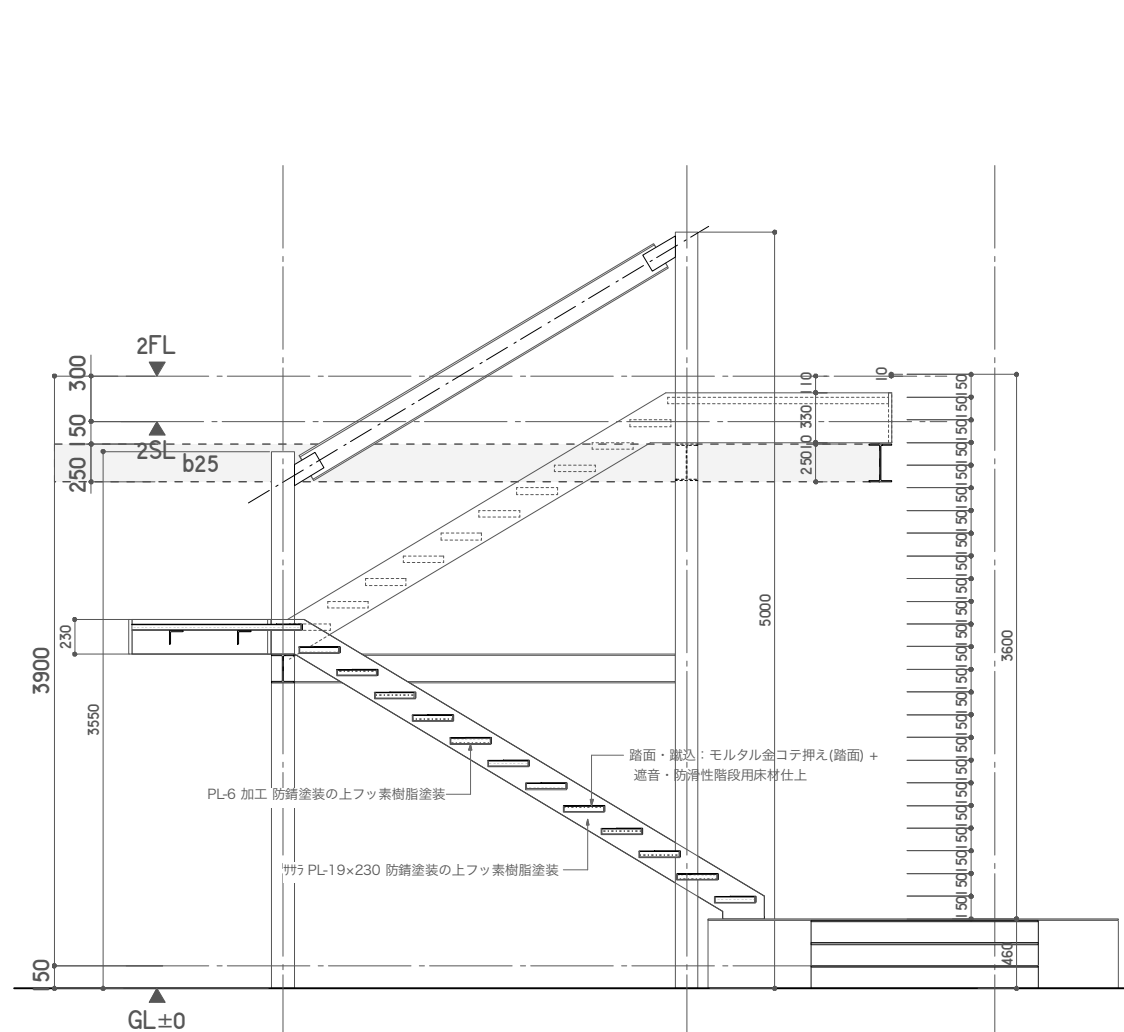

手摺・手摺子: StFB 44x12・StFB 44x9 防錆塗装の上 フッ素樹脂塗装

追加資料01

NOTE

REV.

PROJECT
(仮称)
ポエムキュービット
こども園


TITLE
階段詳細図01

SCALE
1/50

DATE
2025.05.28

DWG NO.


A-43

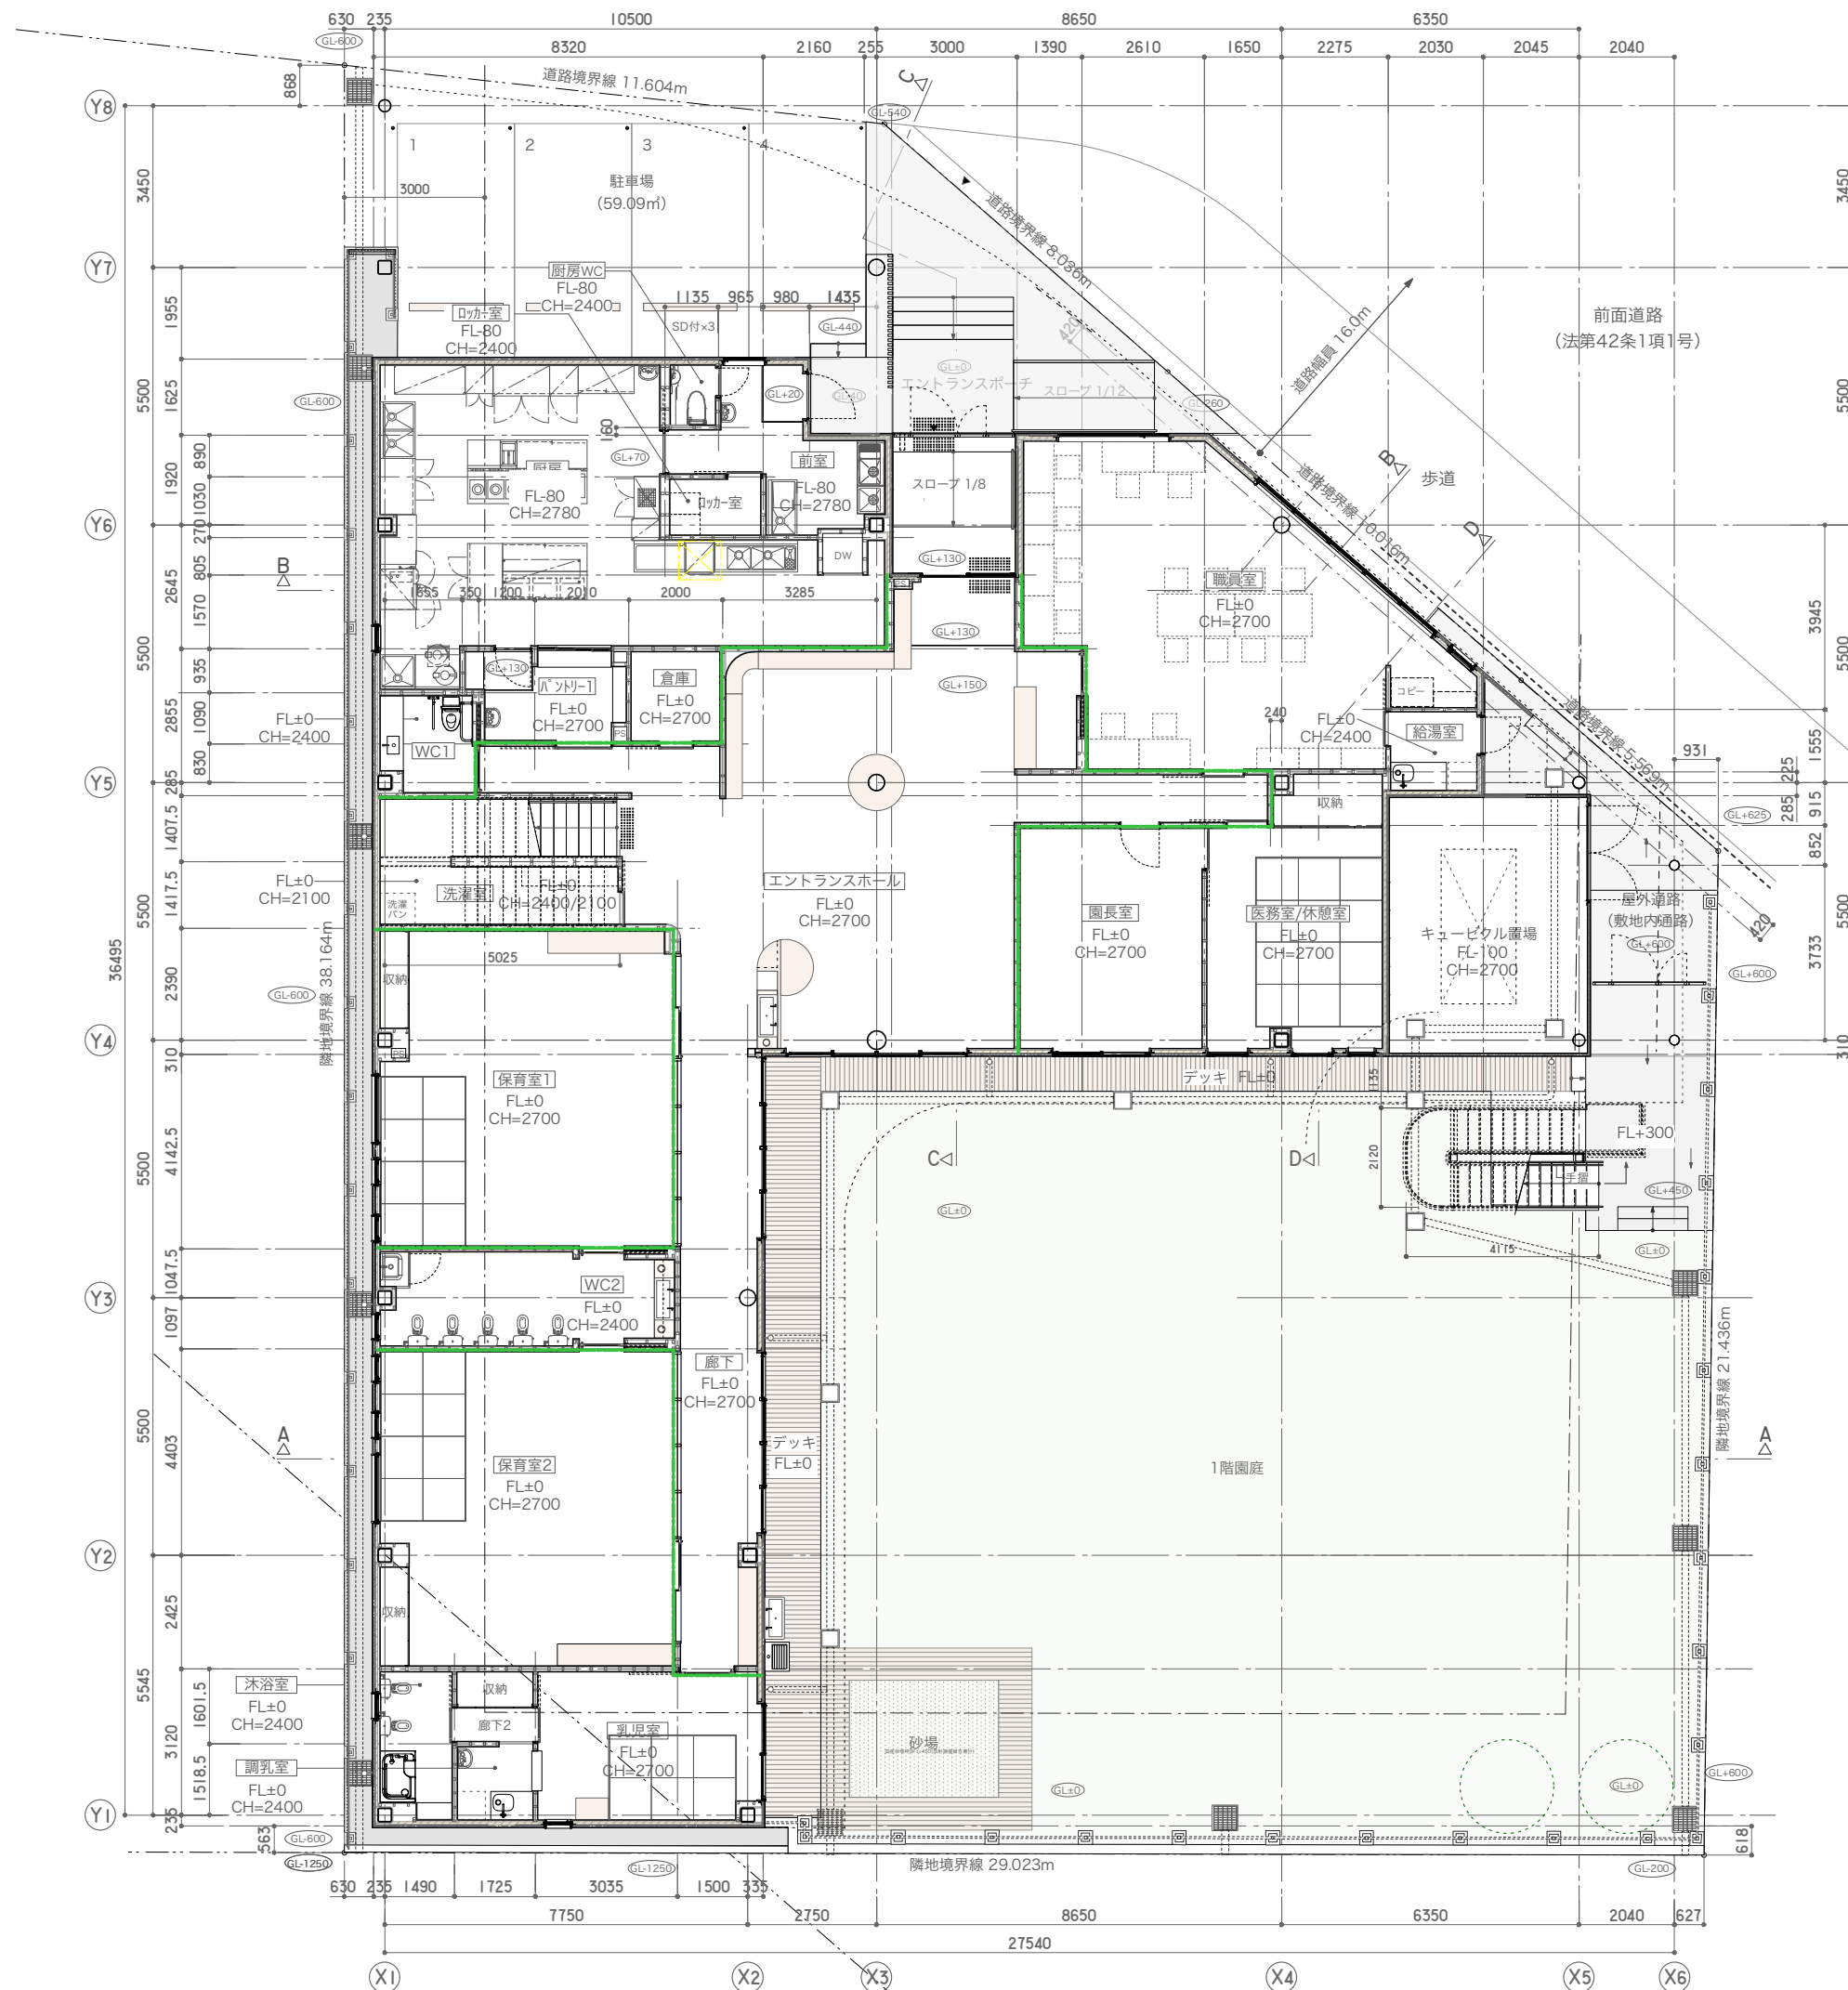


— : 114条区画間仕切壁
60分耐火認定番号
FP060NP-0415(2)

NOTE
REV.
PROJECT (仮称) ポエムキュービット こども園
TITLE 1階平面図
SCALE 1/150
DATE 2025.06.16
DWG NO.

追加資料02

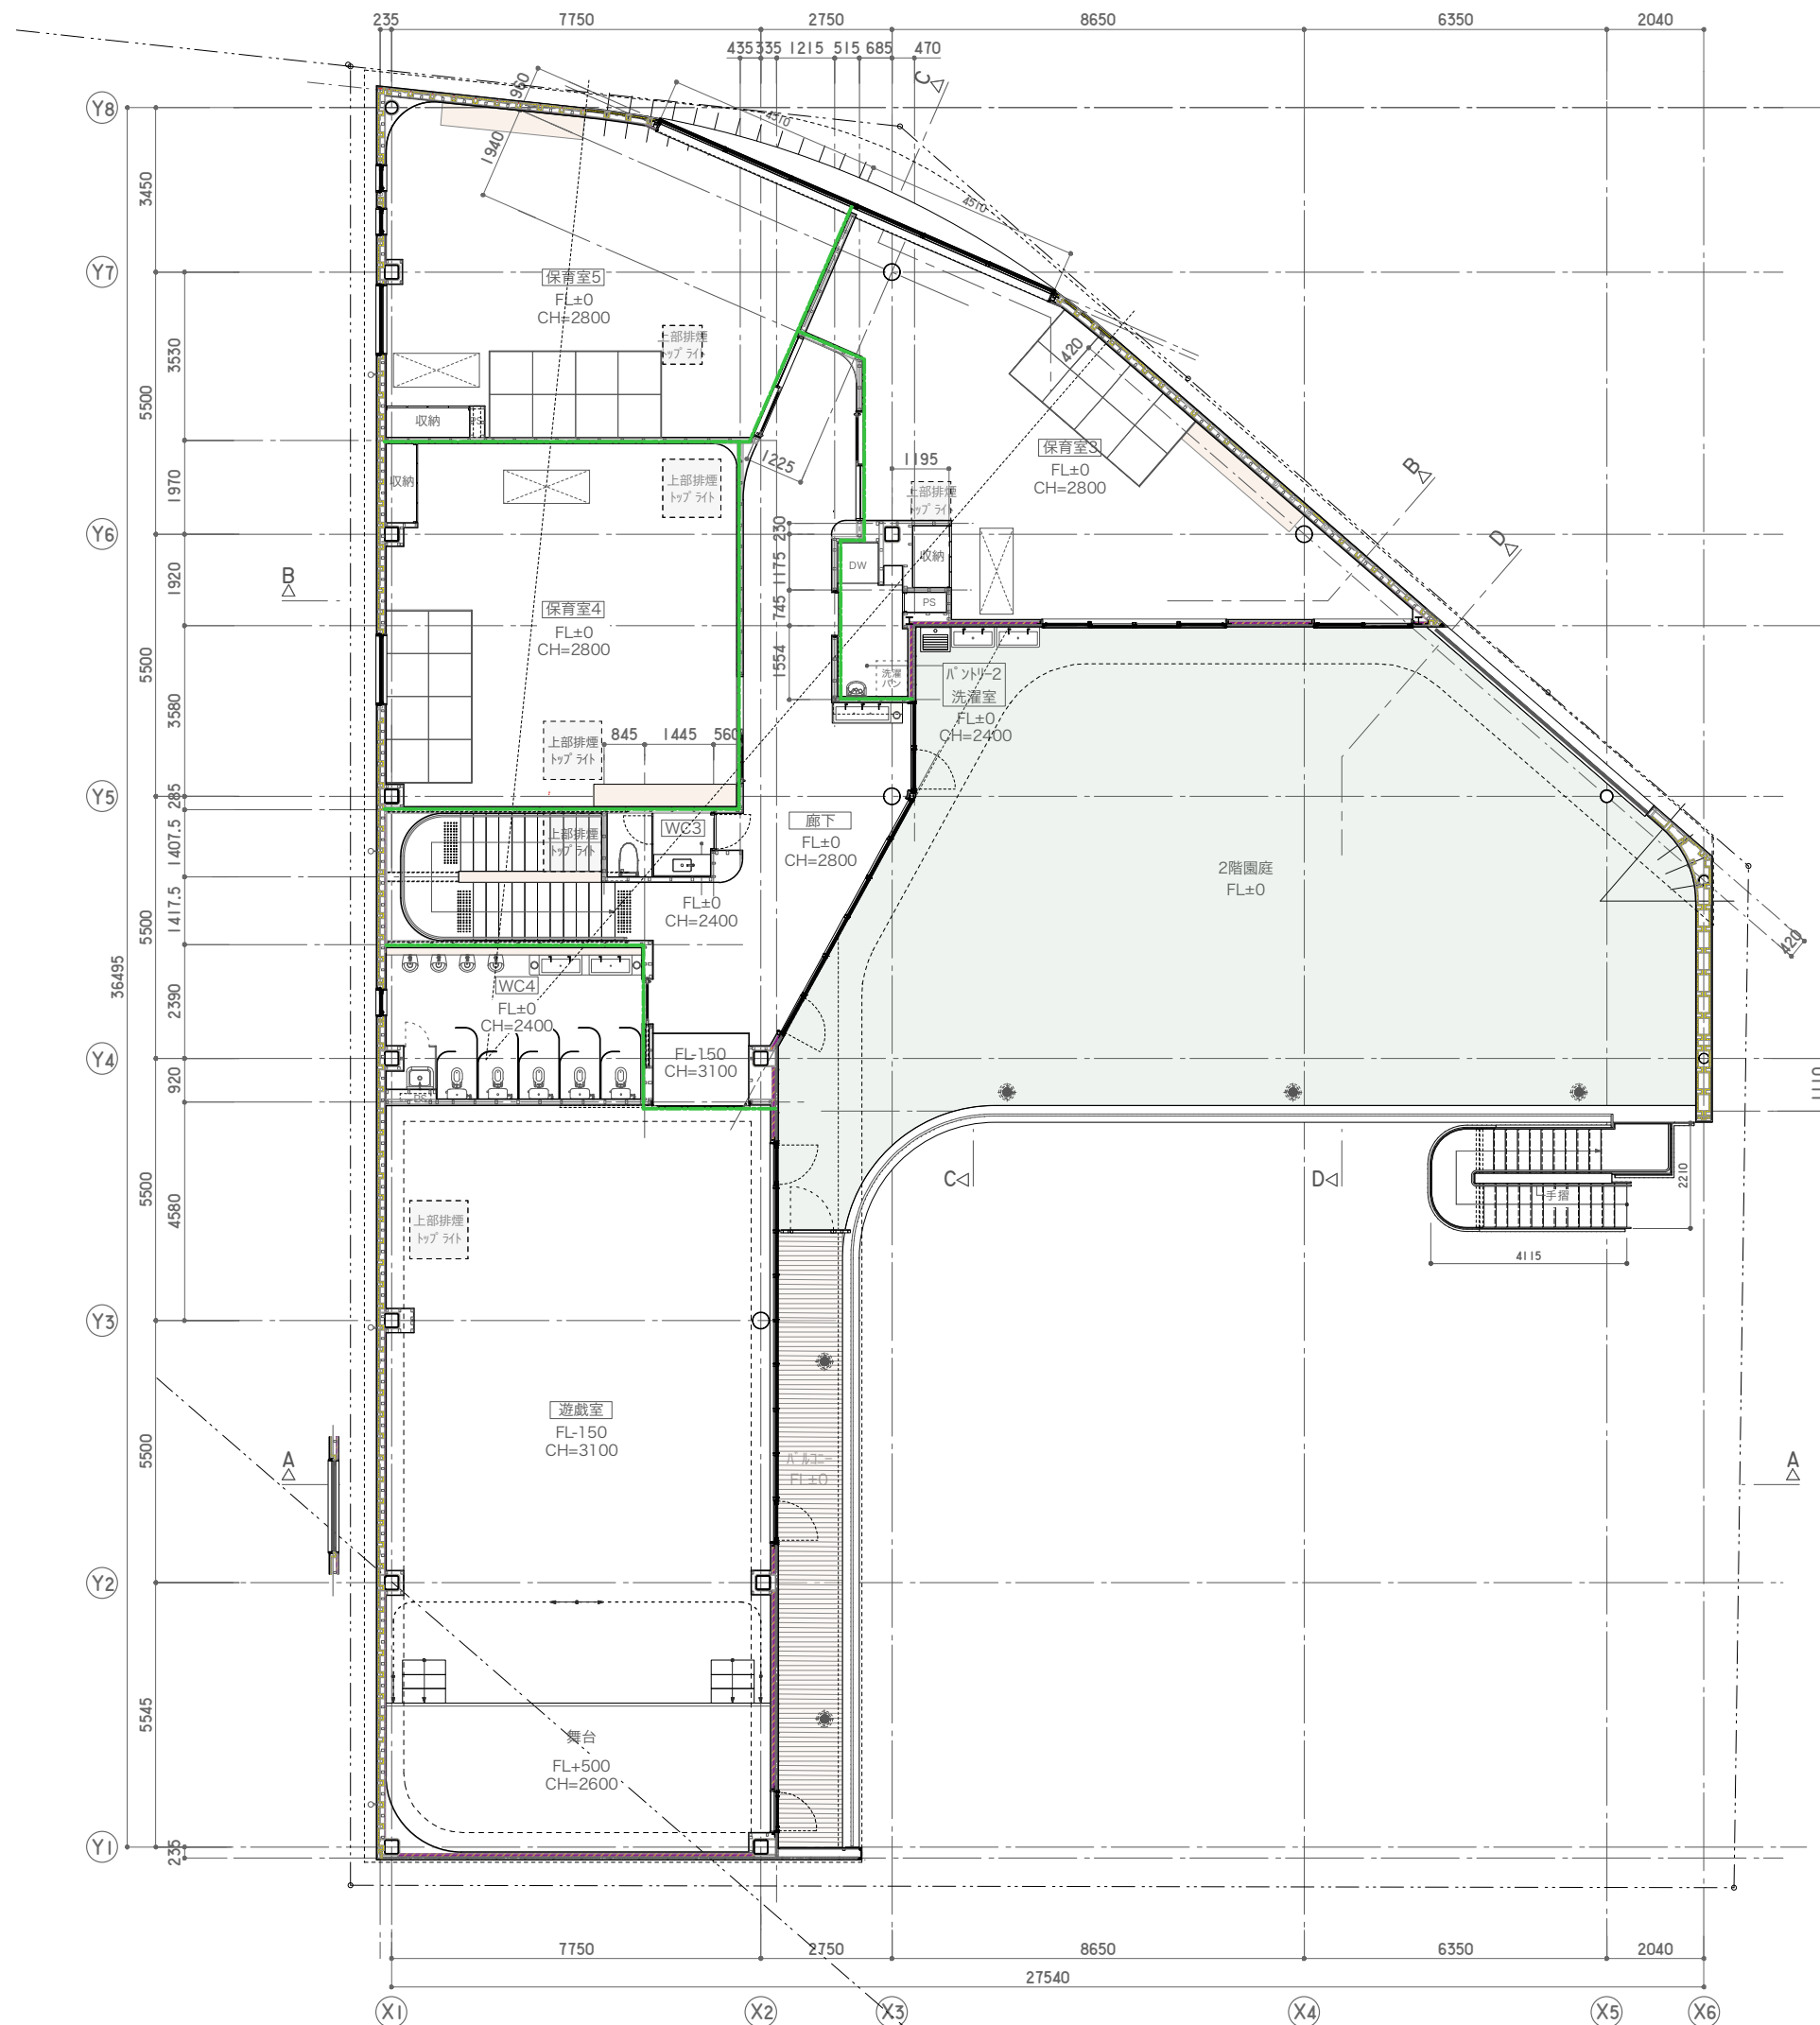

— : 114条区間仕切壁
60分耐火認定番号
FP060NP-0415(2)



NOTE
REV.
PROJECT (仮称) ポエムキュービット こども園
TITLE 2階平面図
SCALE 1/150
DATE 2025.06.16
DWG NO. A-15

追加資料03
